



Situace s vyznačením místa stavby

AKCE: I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

AKCE: I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		



Stavba je rozdělena na 12 úseků
(6 délkových, každý po 1/2 šíře vozovky)

AKCE: I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		



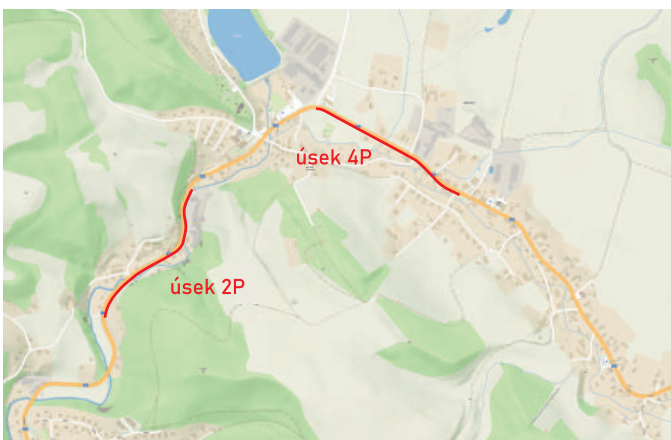


Schéma PDZ pro každý úsek stavby (resp. pro dva současně)
bude použito opakovaně pro:


- 1) odstranění přídlažby, 2) pokládku přídlažby, 3) frézování povrchu
- 4) pokládku povrchu

Postup prací:

- 1) vyfrézování podélného pruhu podél přídlažby v celém úseku (v obou směrech)
- 2) odstranění přídlažby v úseku 1L
- 3) odstranění přídlažby v úseku 4L a pokládka přídlažby v úseku 1L
- 4) odstranění přídlažby v úseku 2L a pokládka přídlažby v úseku 4L
- 5) odstranění přídlažby v úseku 5L a pokládka přídlažby v úseku 2L
- 6) odstranění přídlažby v úseku 3L a pokládka přídlažby v úseku 5L
- 7) odstranění přídlažby v úseku 6L a pokládka přídlažby v úseku 3L
- 8) pokládka přídlažby v úseku 6L
- 9) frézování, sanace, úprava poklopů v úseku 1L
- 10) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 4L a 1L
- 11) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 2L a 4L
- 12) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 5L a 2L
- 13) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 3L a 5L
- 14) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 6L a 3L
- 15) frézování, sanace, úprava poklopů v úseku 6L
- 16) pokládka povrchu v úseku 1L
- 17) pokládka povrchu v úsecích 4L a 1L
- 18) pokládka povrchu v úsecích 2L a 4L
- 19) pokládka povrchu v úsecích 5L a 2L
- 20) pokládka povrchu v úsecích 3L a 5L
- 21) pokládka povrchu v úsecích 6L a 3L
- 22) pokládka povrchu v úseku 6L
- 23) odstranění přídlažby v úseku 1P
- 24) odstranění přídlažby v úseku 4P a pokládka přídlažby v úseku 1P
- 25) odstranění přídlažby v úseku 2P a pokládka přídlažby v úseku 4P
- 26) odstranění přídlažby v úseku 5P a pokládka přídlažby v úseku 2P
- 27) odstranění přídlažby v úseku 3P a pokládka přídlažby v úseku 5P
- 28) odstranění přídlažby v úseku 6P a pokládka přídlažby v úseku 3P
- 29) pokládka přídlažby v úseku 6P
- 30) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 1P
- 31) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 4P a 1P
- 32) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 2P a 4P
- 33) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 5P a 2P
- 34) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 3P a 5P
- 35) frézování, sanace, úprava poklopů v úsecích 6P a 3P
- 36) frézování, sanace, úprava poklopů v úseku 6P
- 37) pokládka povrchu v úseku 1P
- 38) pokládka povrchu v úsecích 4P a 1P
- 39) pokládka povrchu v úsecích 2P a 4P
- 40) pokládka povrchu v úsecích 5P a 2P
- 41) pokládka povrchu v úsecích 3P a 5P
- 42) pokládka povrchu v úsecích 6P a 3P
- 43) pokládka povrchu v úseku 6P

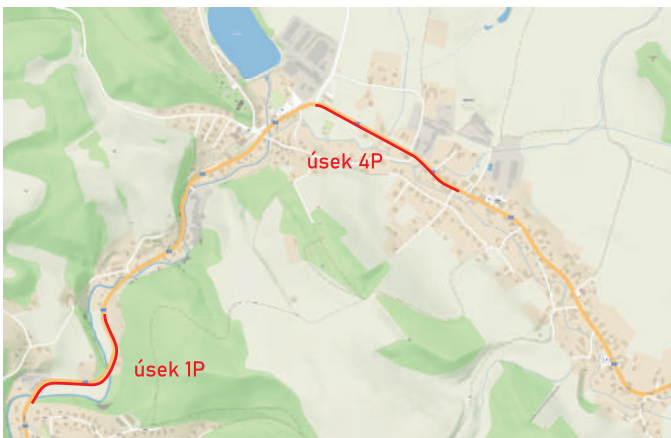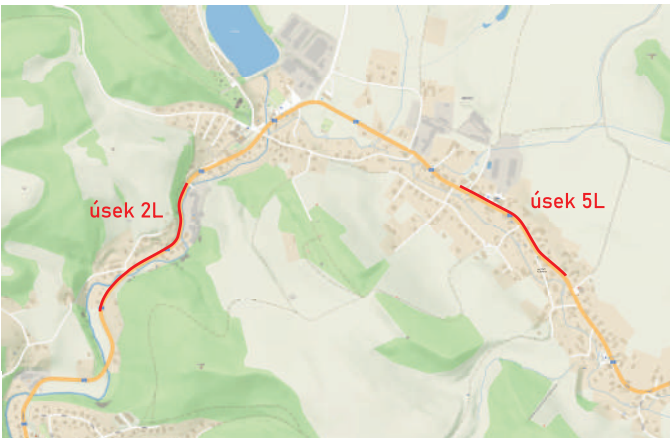

ÚSEK 1L
(analogicky 1P)

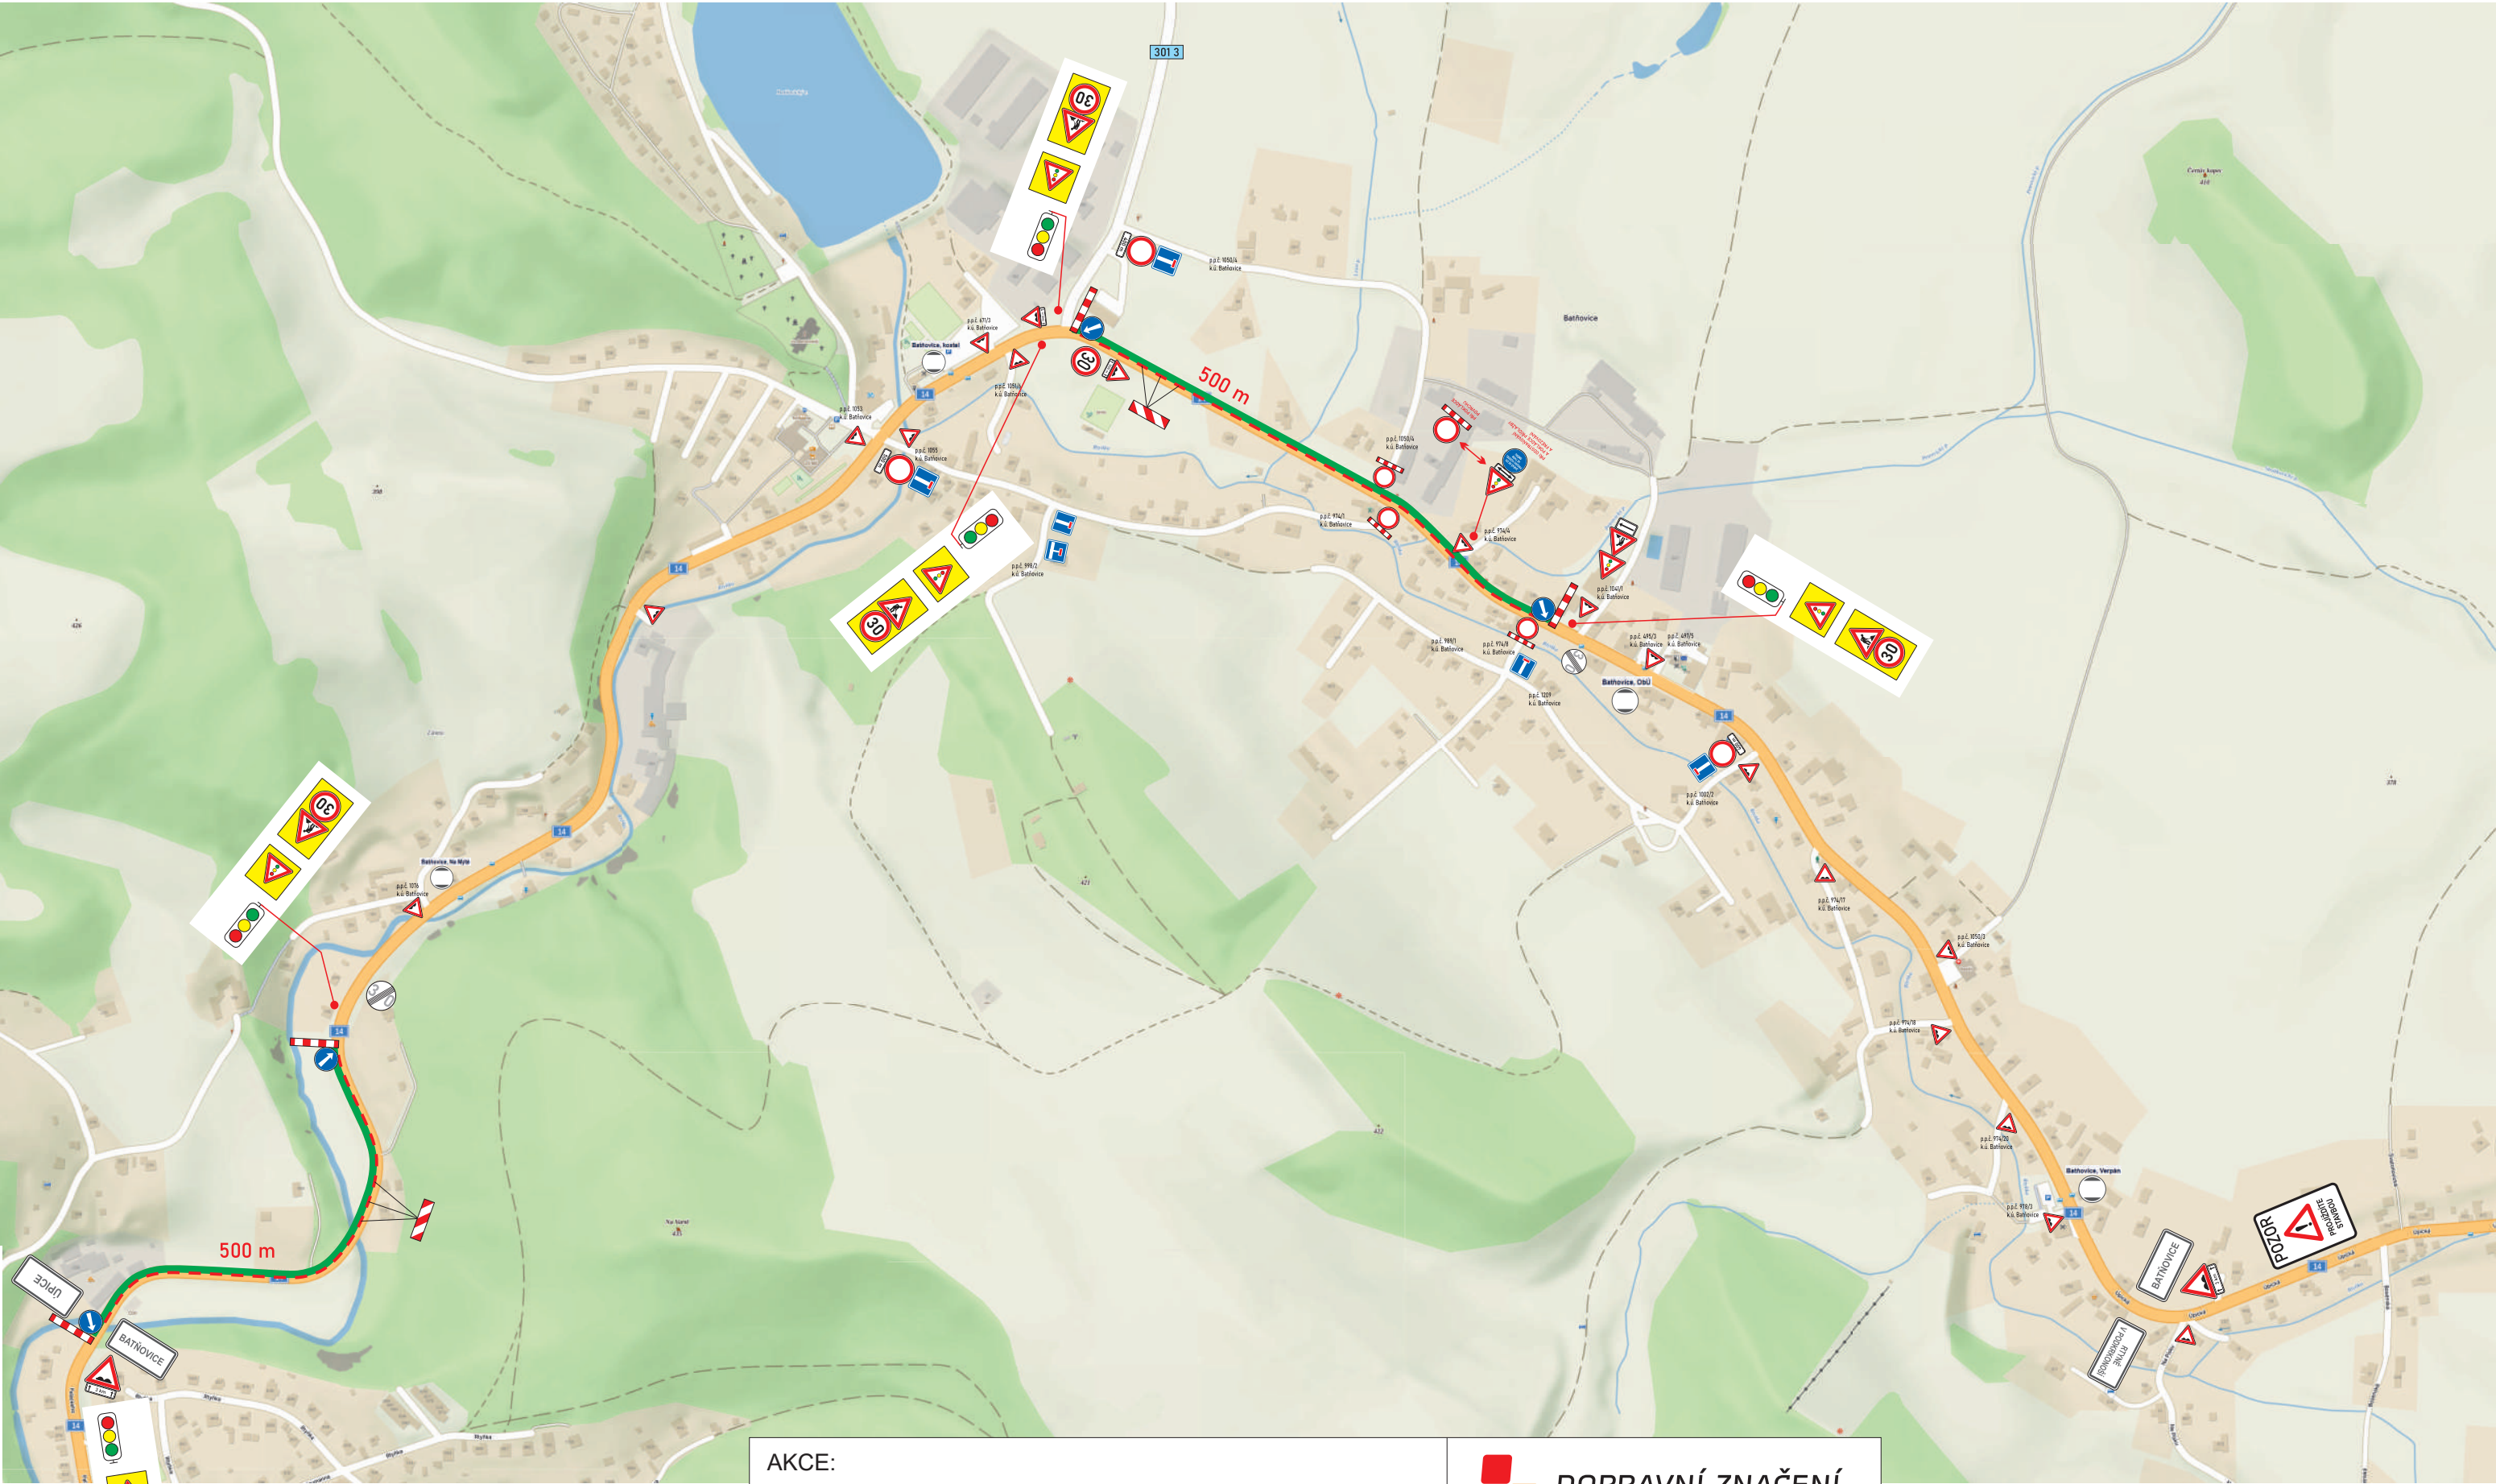



AKCE: I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ÚSEK 1L + 4L
(analogicky 1P + 4P)




AKCE: I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ÚSEK 2L + 4L
(analogicky 2P + 4P)

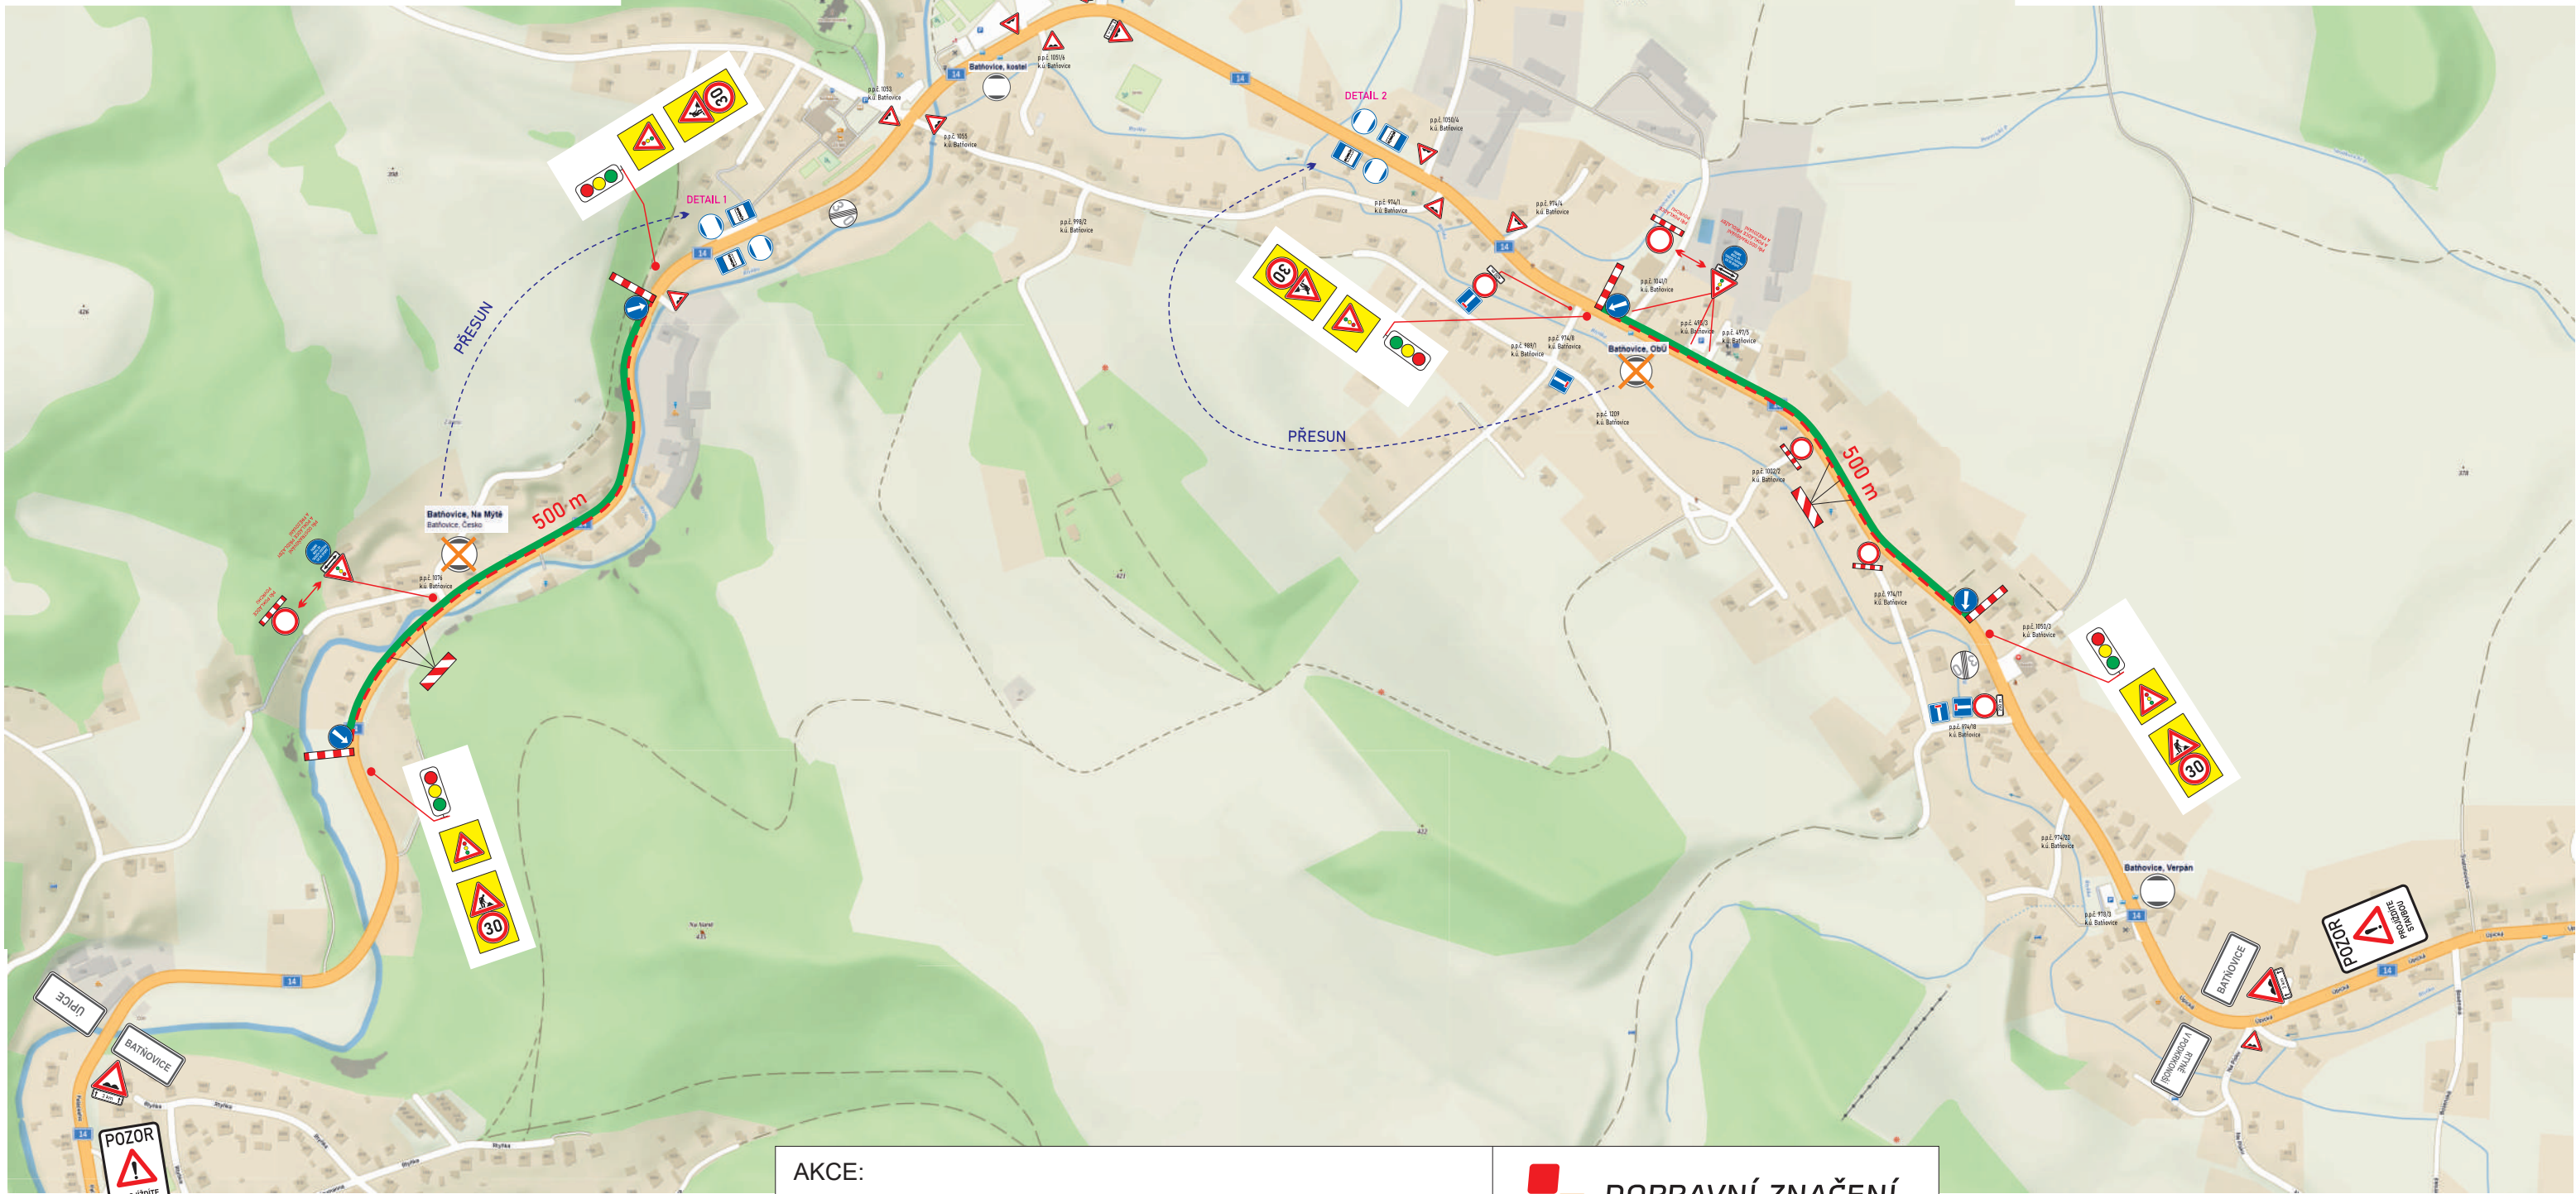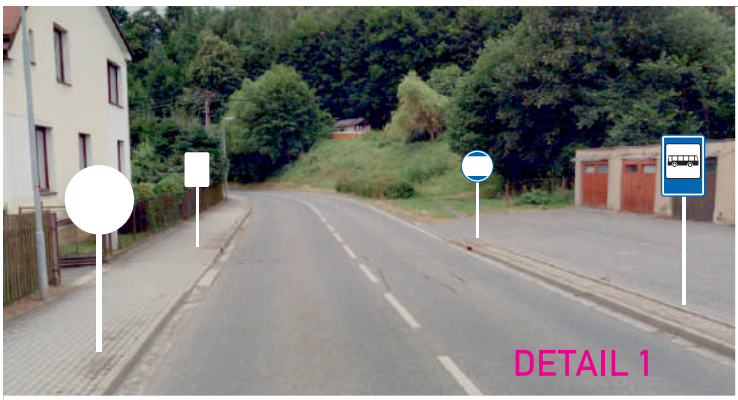

AKCE:		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ÚSEK 2L + 5L
(analogicky 2P + 4P)

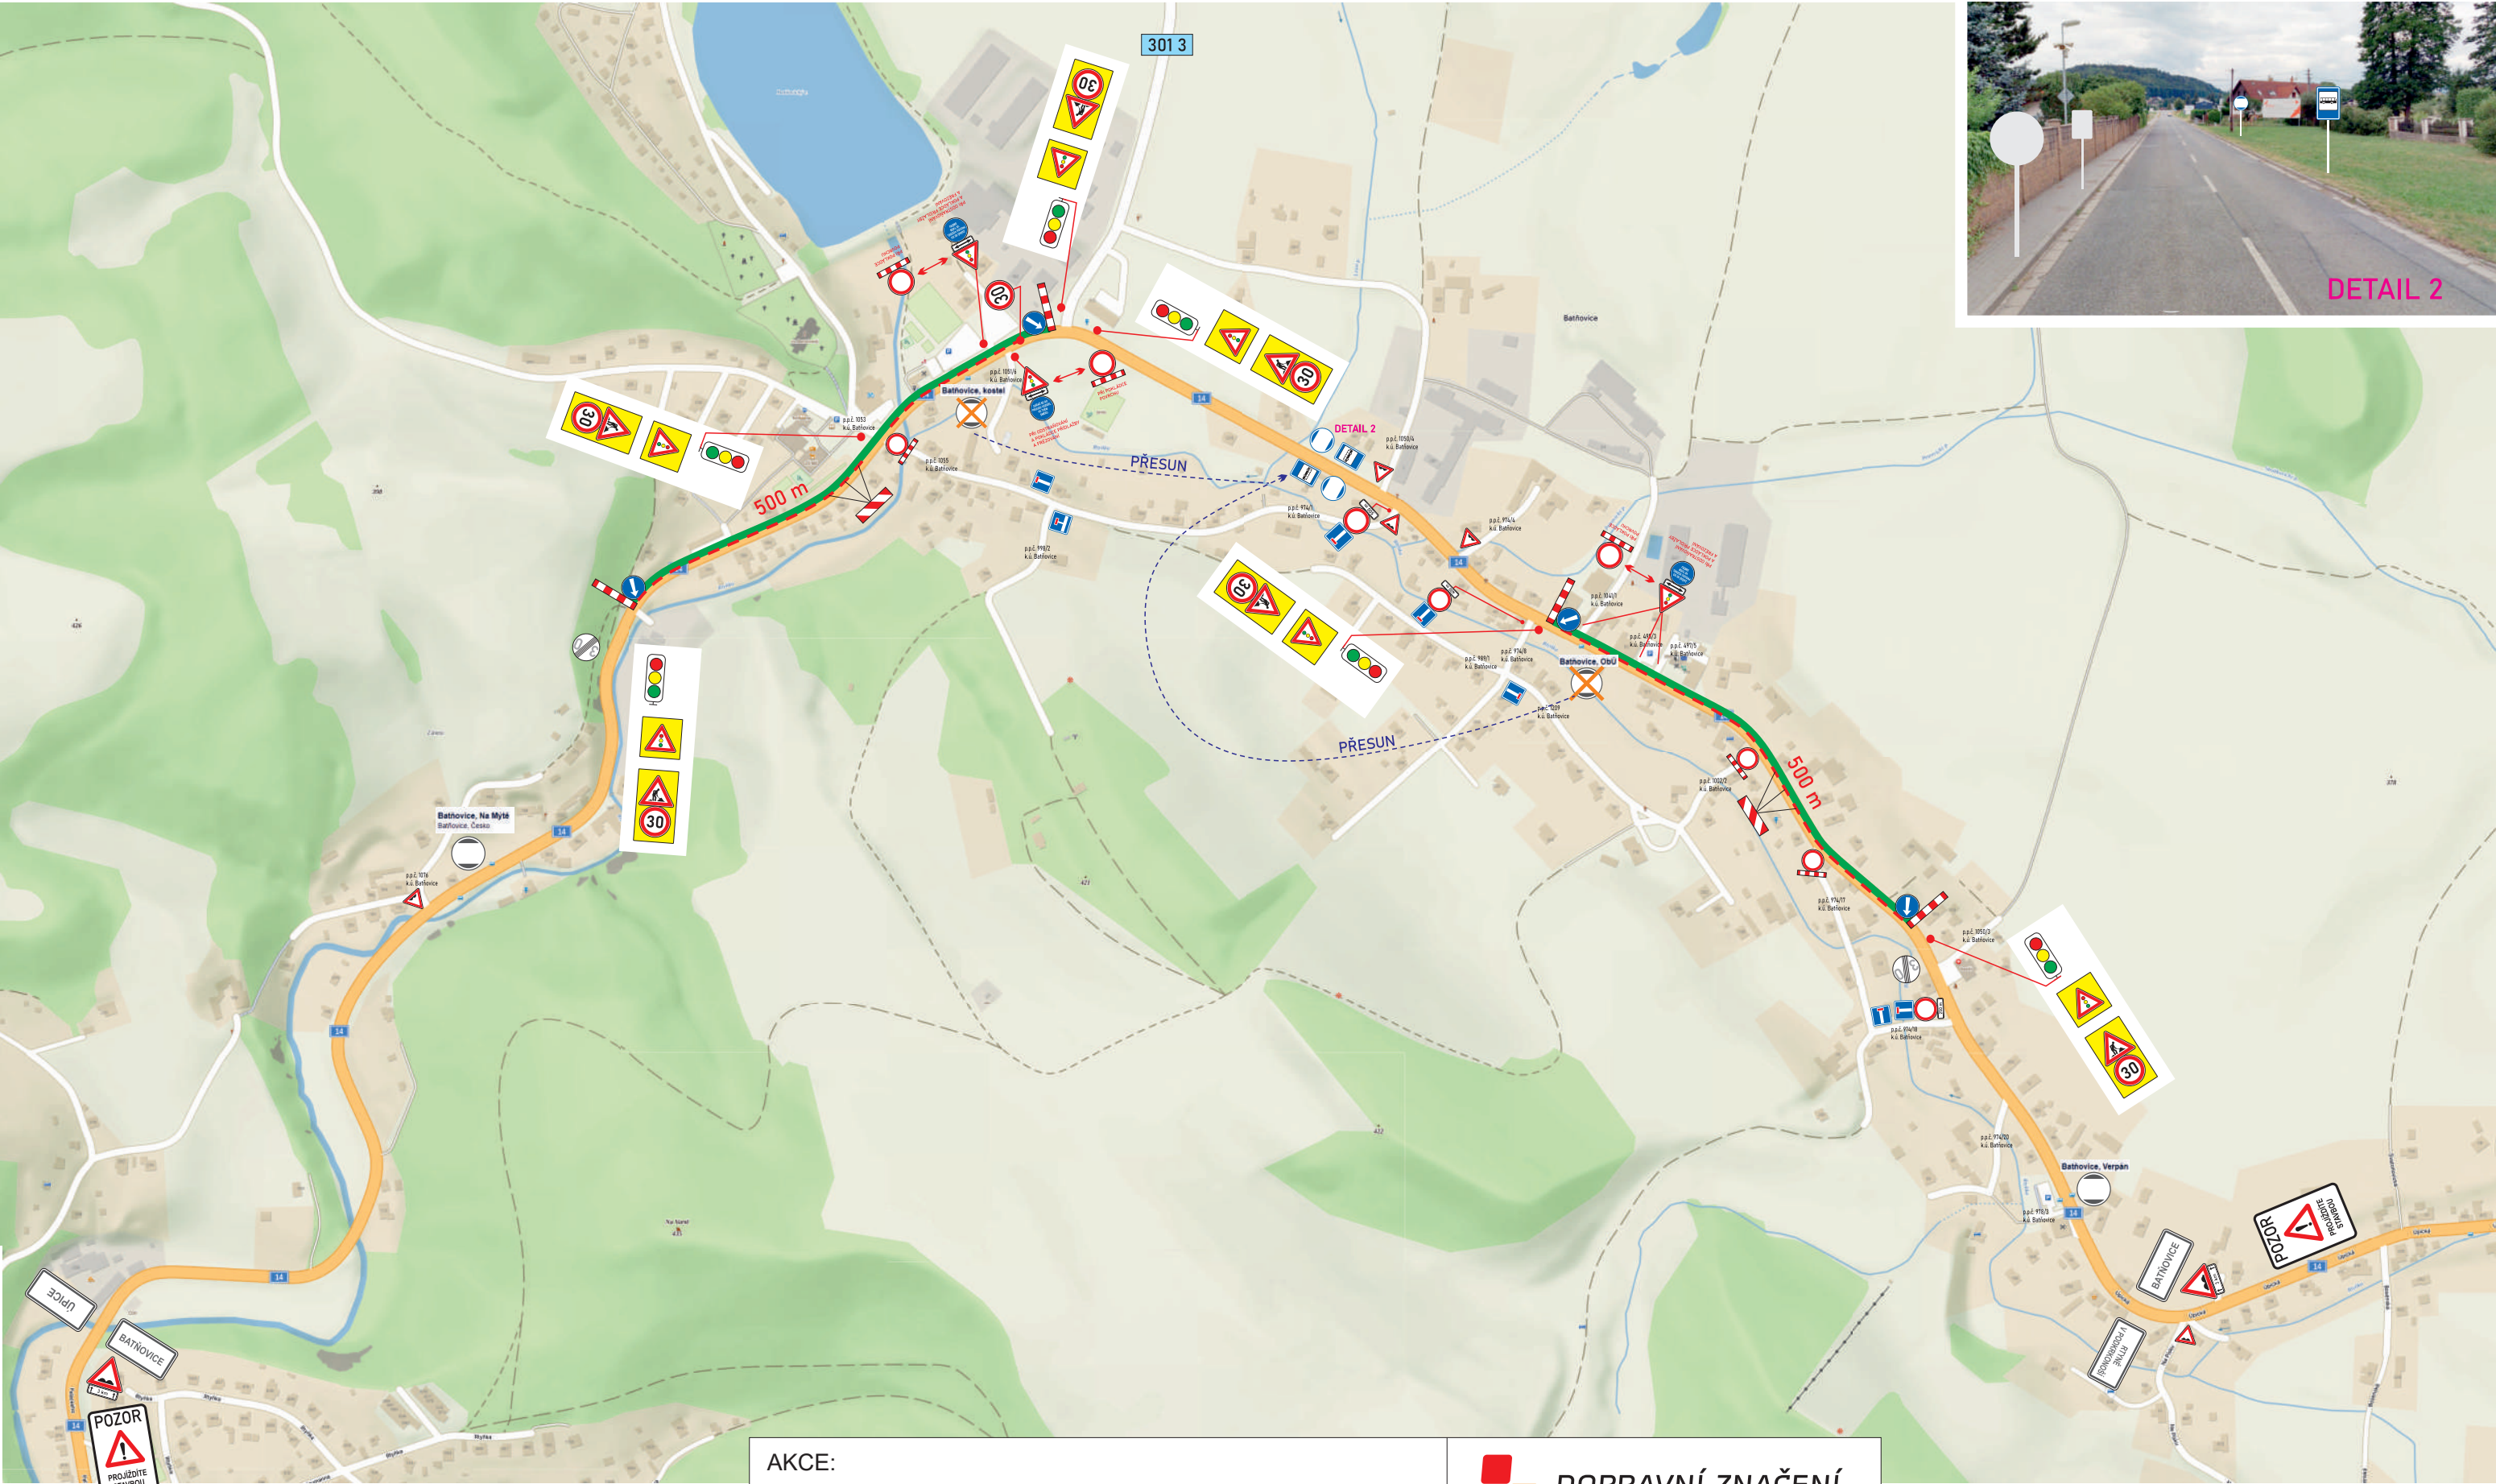


AKCE:		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ÚSEK 3L + 5L
(analogicky 3P + 5P)



AKCE:		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ÚSEK 3L + 6L
(analogicky 3P + 6P)

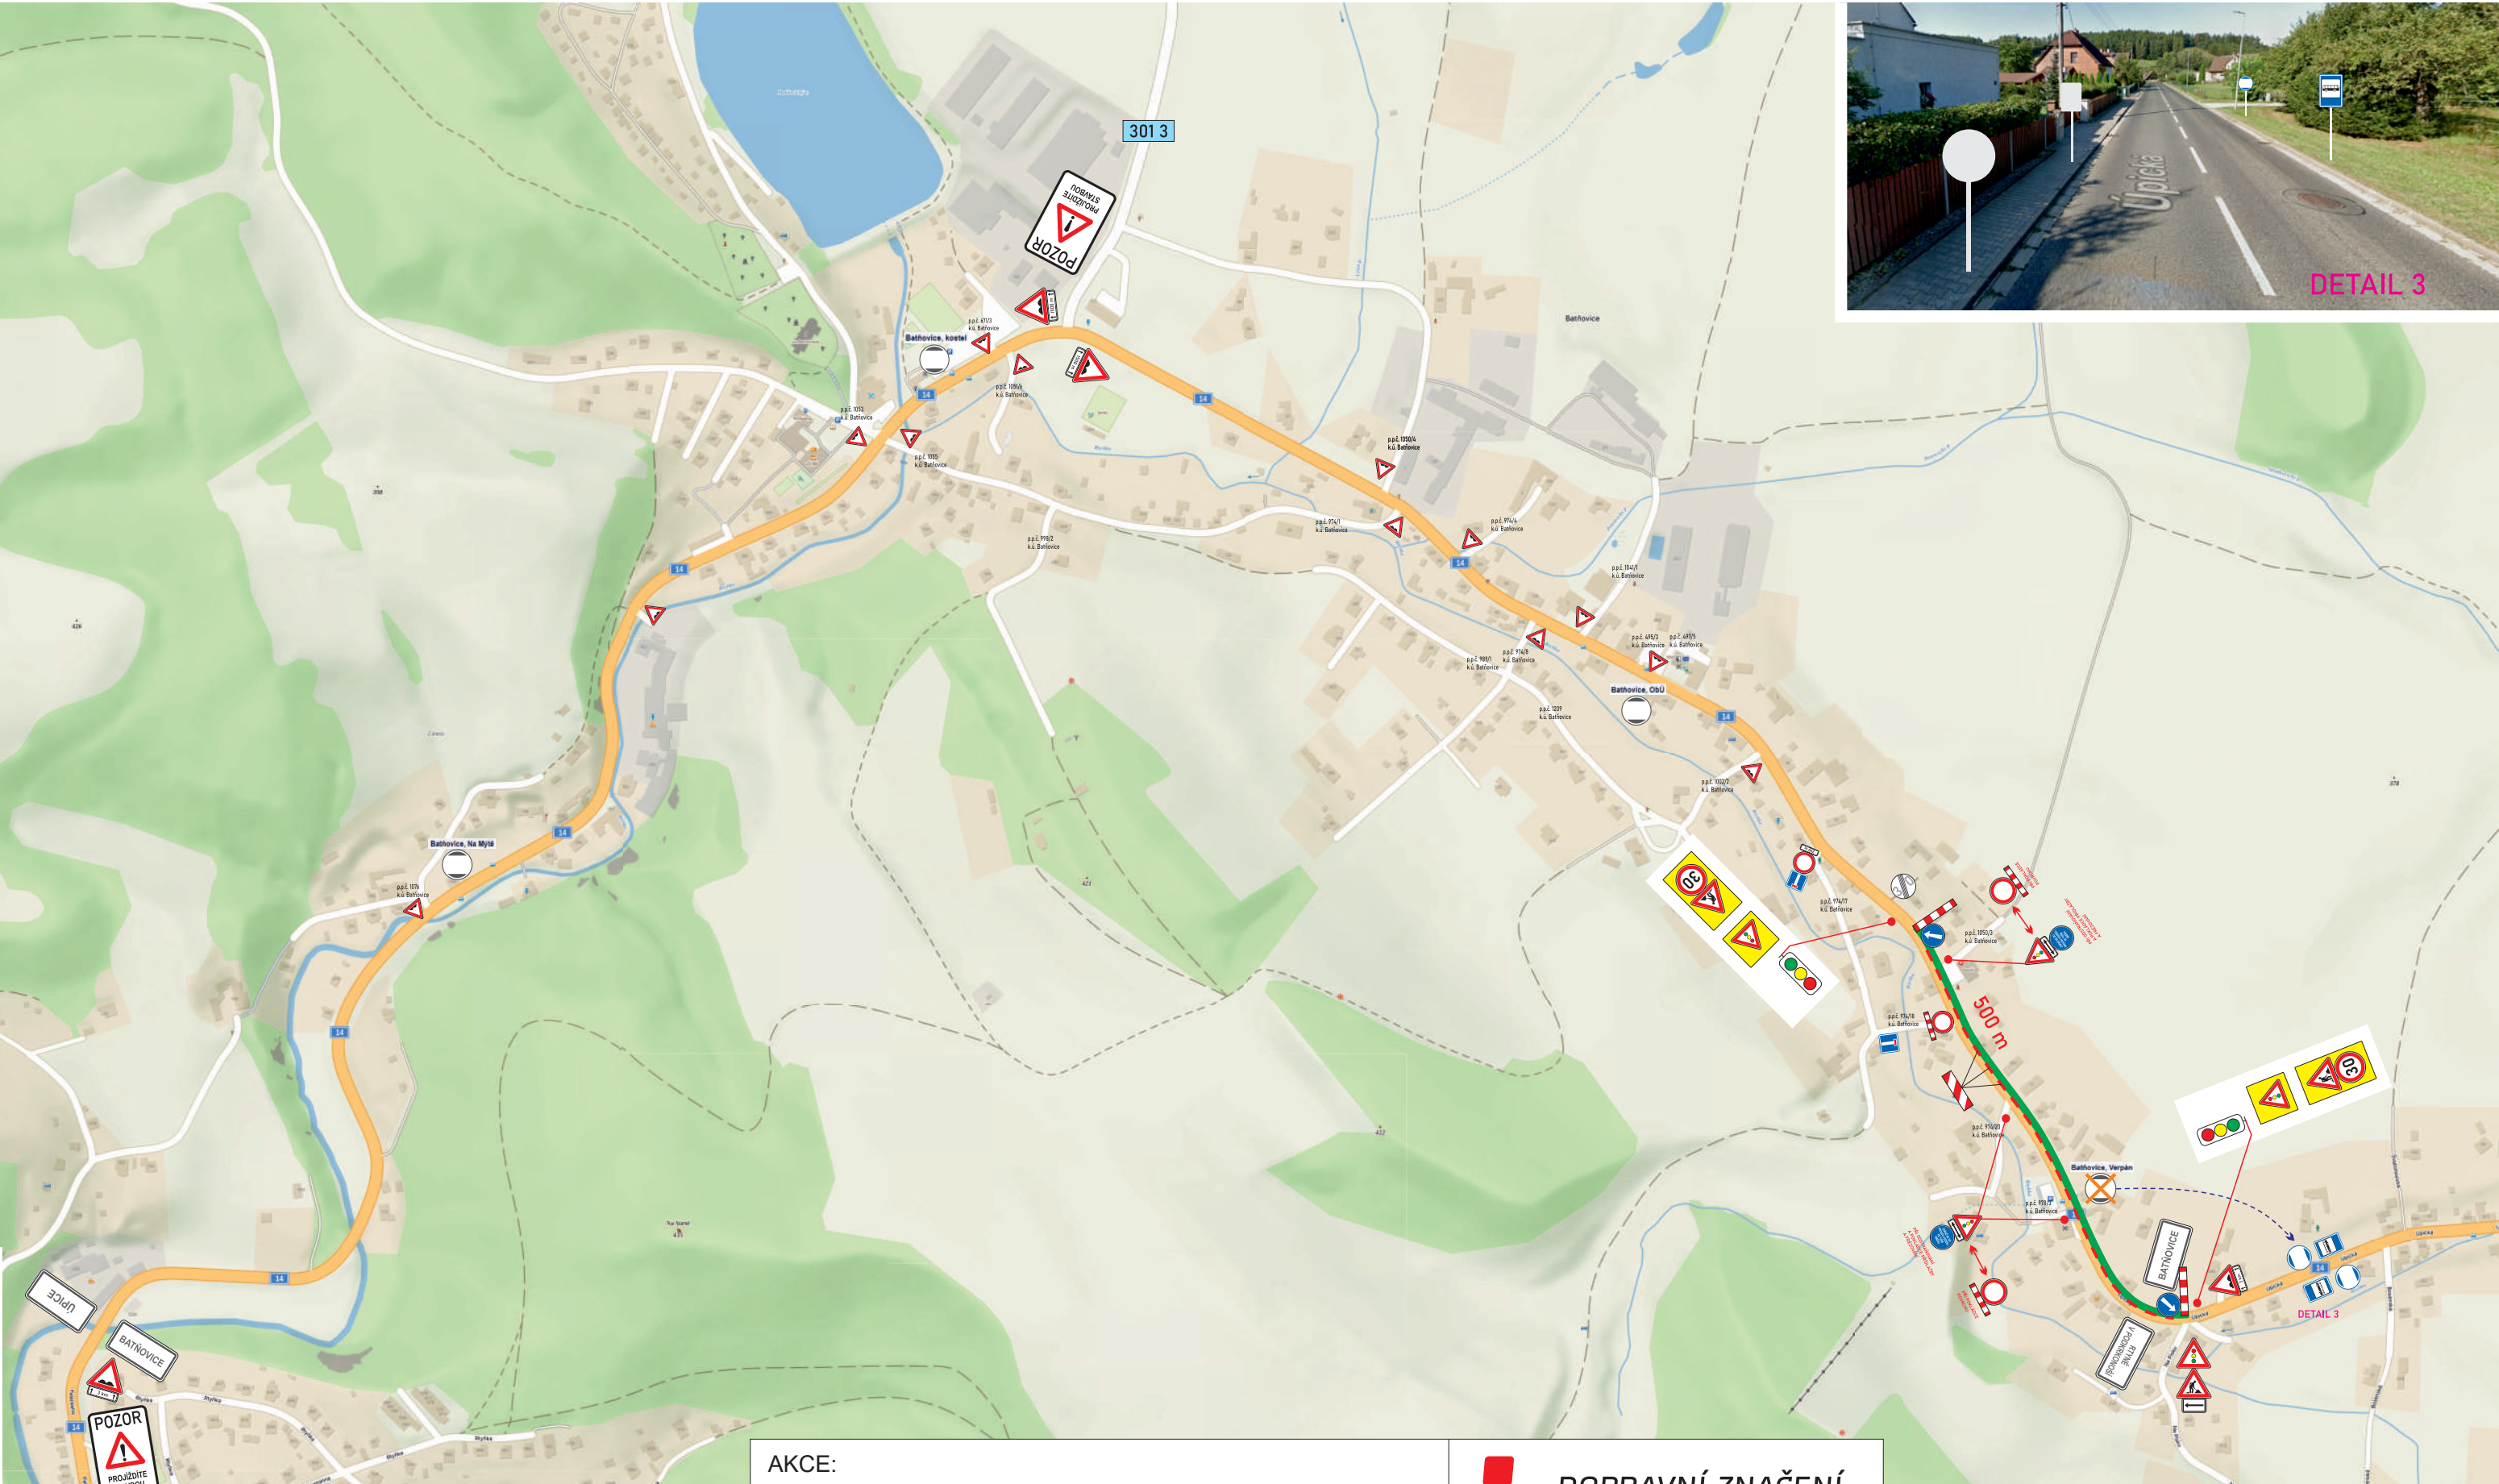

AKCE: I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ÚSEK 6L
(analogicky 6P)
